

- ☐ BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
☒ BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____

Ref.: _____ Compteur n°: 5163713-1005

Index: _____

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION: Rue grande commune 30B

PROPRIETAIRE: MR BOGLAN IACH

Adresse: IACH

DEMANDEUR: IACH

Adresse: _____

INSTALLATEUR: EXISTANTE

Adresse: _____

TVA ou CI: _____

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 23/11/2015 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant: (RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur) GND

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: HABITATION

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art.86

Raccordement: Tension 3x400V+V V Protection raccordement MAX 40 A

Câble aliment, tableau, princ.: 4 X 16 mm² Inter.gén.: type DTETAA 40A 300mA

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 19; RA: 19 Ohm; RI tot 1 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: Von Vehemas en annexe

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

Neant

Note: - le contrôle concerne uniquement l'extension de la maison
- l'installation est conforme pour du 3x400V+V max 40A

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le:

le responsable du distributeur

nom:

signature:

- CONCLUSION** ☒ 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 23/11/2015 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- ☐ 2. L'installation n'est **pas conforme**
- ☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____.

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)

* VERSLAG - RAPPORT *


pour Le Directeur,



23-11-2015


Pascal Chenot / 438

- A TAQUE DE CUISSON
- B PRISES + ECLAIRAGE CHAMBRE 1
- C PRISES LIVING
- D PRISES HALL ENTREE
- E ECLAIRAGE + 1 PRISE BUANDERIE - 1 PRISE EXTERIEUR
- F ECLAIRAGE HALL
- G ECLAIRAGES EXTERIEUR + 1 PRISE
- H ECLAIRAGE LIVING - CUISINE
- I PRISES CUISINE MUR CHAMBRE + 1PRISE LIVING
- J PRISES CUISINE MUR FOND
- K PRISES CUISINE MUR BUANDERIE
- L PRISES HOTTE + FOUR
- M PRISES + ECLAIRAGE CHAMBRE 2
- N LAVE VAISSELLE
- O CHAUFFERIE
- P SALLE DE BAIN 1
- Q SALLE DE BAIN 2
- R MACHINE A LAVER
- S PRISES BUANDERIE + ECLAIRAGE W.C



Rue grande commune 30A 5340 Guesves

Taque de cuisson

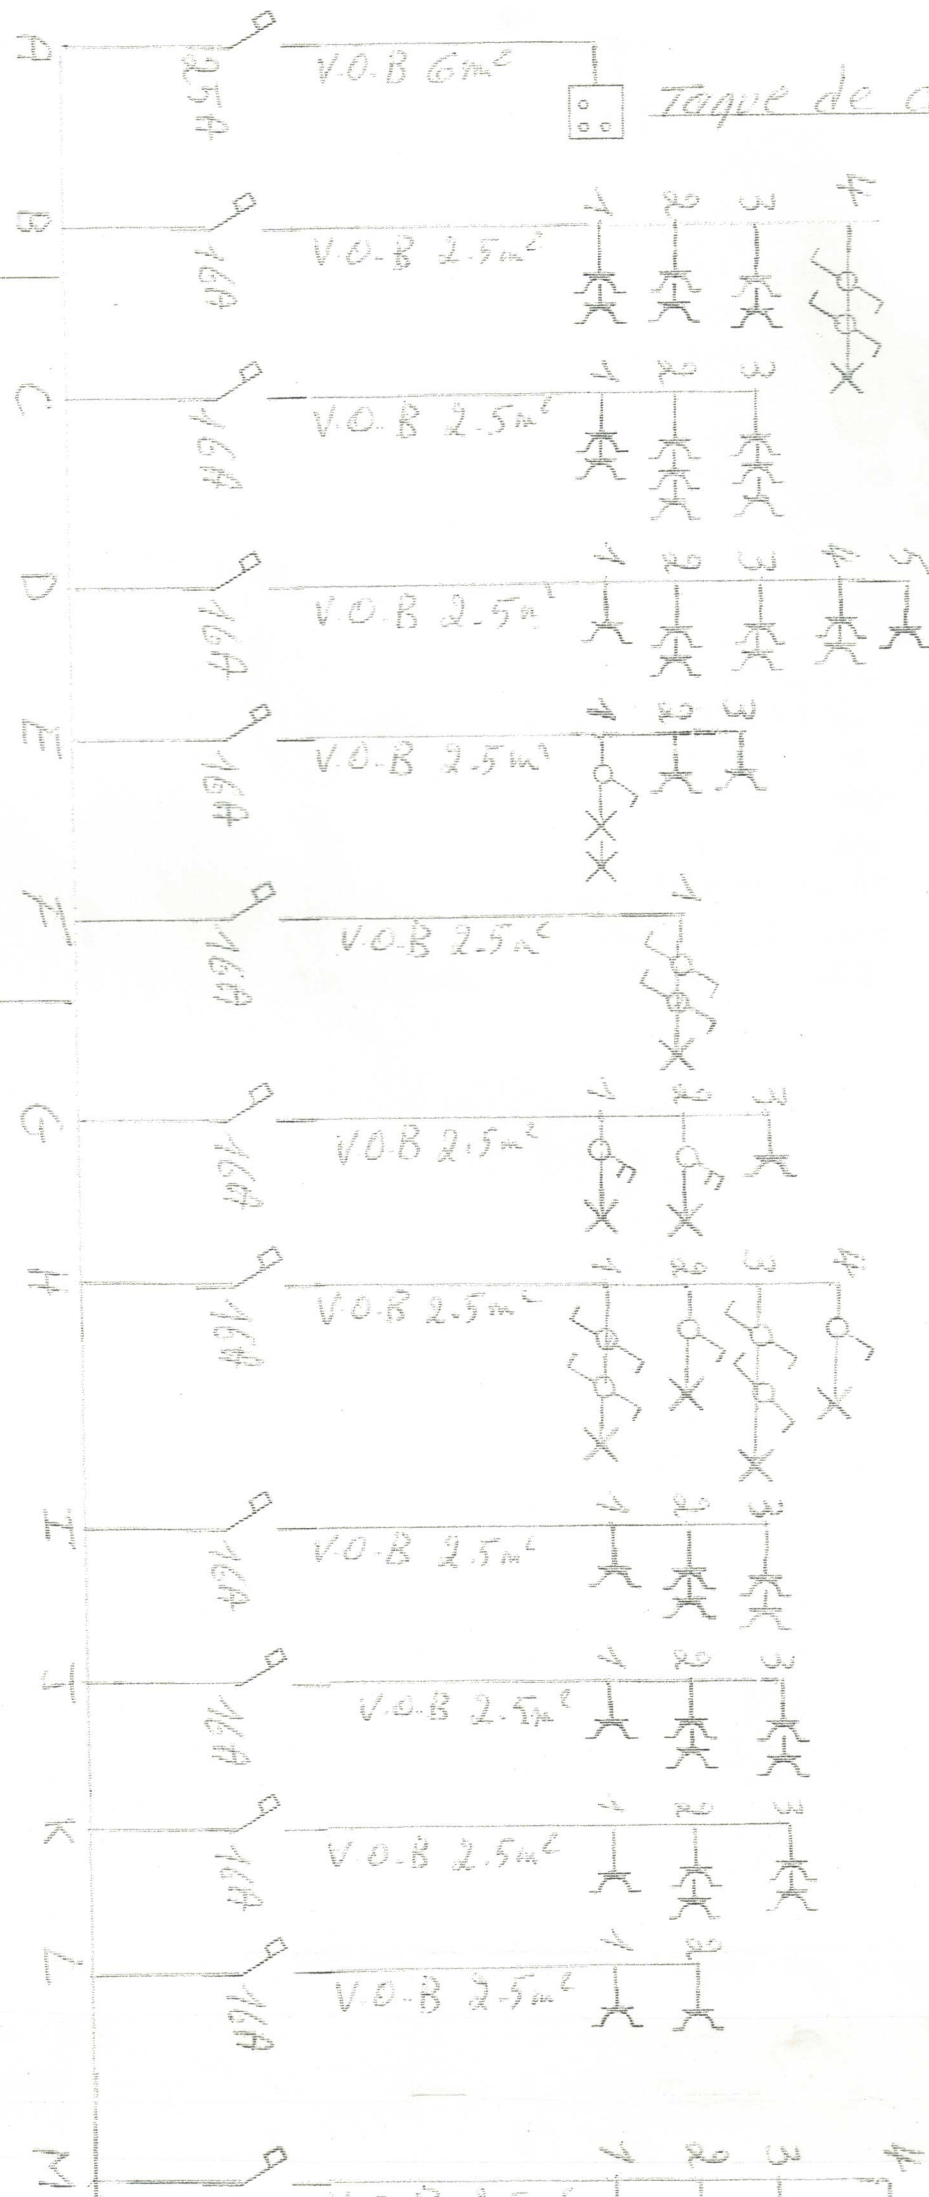

Le delegue de l'organisme agree




23-11-2015

Pascal Chenot / 438

[Signature]

05/12/5

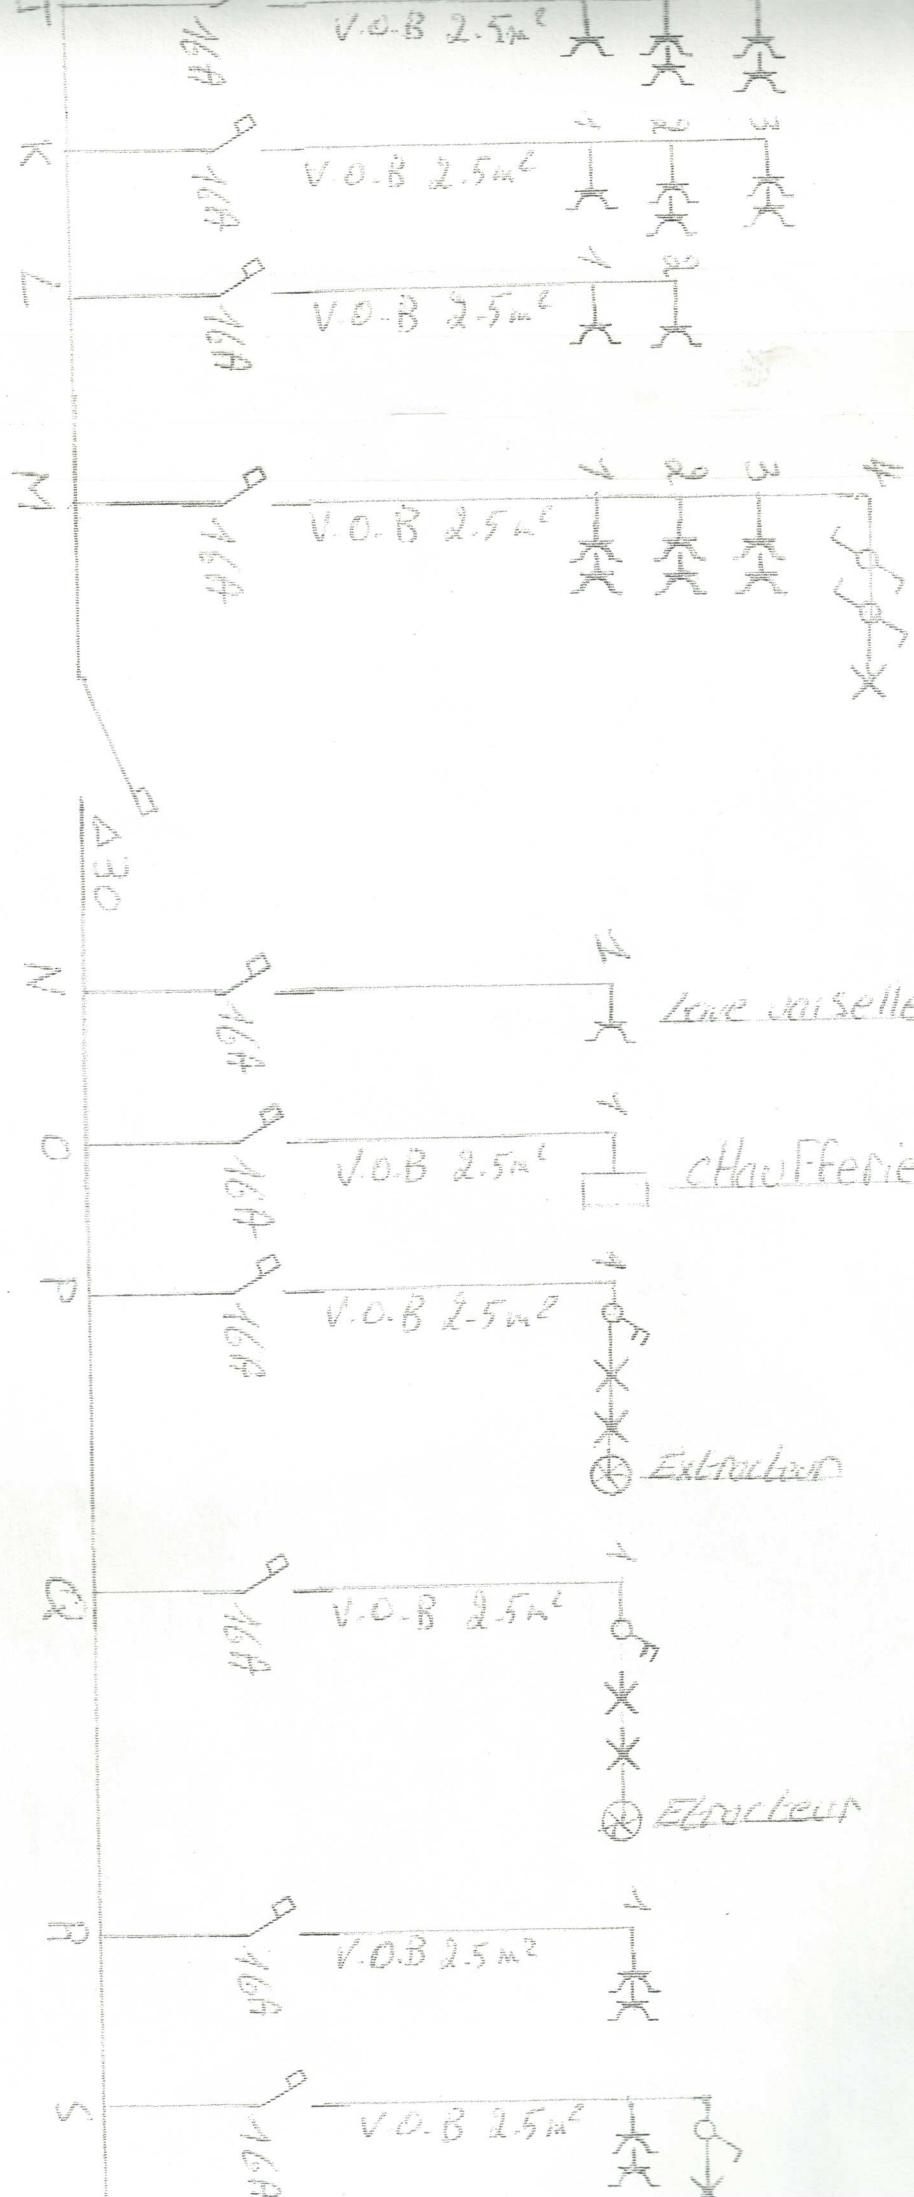

isme agree



Le responsable de l'exécution du travail
