

PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 28/2019/53495/01:1

RÉF. 28/2019/53495/01:2

DATE DU CONTRÔLE 14/02/2019 **AGENT VISITEUR** Loic Giltay
ADRESSE DU CONTRÔLE Rue de Troka 455A - 5300 Andenne **TYPE DE CONTRÔLE** Visite périodique (Art. 271)



› DONNÉES GÉNÉRALES

Adresse de l'installation Rue de Troka 455A - 5300 Andenne
Type de locaux Unité d'habitation (maison)
installateur Monsieur Fichet
Responsable des travaux FICHET Renaud
#TVA BE0676.760.981
Dérogations applicables/appliquées Art. 271bis
Recontrôle après 276 bis Recontrôle après 276bis
Revisite Certinergie Revisite Certinergie
Références du PV précédent 28/2017/24539/01

› DONNÉES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD) AIEG
Code EAN non communiqué
Numéro du compteur 4386125
Index jour/nuit 117104,3/115276,9
Type de raccordement aéro-souterrain
Câble compteur - tableau VFVB 4 x 10 mm²
Tension nominale de service 3x400V + N - AC
Courant nominal de la protection de branchement 15A

› CONTRÔLE

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position	OK	Nombre de tableaux	1	Nombre de circuits	23
Les fondations datent	D'avant le 1/10/1981	Dispositif différentiel de tête	ID - 40A - 300mA - type A - test OK		
Prise de terre	Piquets	Dispositif différentiel "sdb"	ID - 40A - 30mA - type A - test OK		
Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω)	22,6	Raccordement	OK		
Conformité des liaisons équipotentielles et des PE	OK	Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles	OK		
Test de continuité	Concluant	Eclairage/machines	Sans objet		
Contrôle boucle de défaut	Concluant	Protection contre les contacts directs	OK		
Protection contre les contacts indirects	OK	Résistance minimale d'isolement mesurée (MΩ)	6,41		

CONCLUSION : CONFORME



A la date du 14/02/2019, l'installation électrique de Rue de Troka 455A - 5300 Andenne est conforme au Règlement Général des Installations Electriques.
Le contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.
Un plombage en amont et en aval du dispositif de protection à courant différentiel résiduel est placé afin de rendre inaccessible ses bornes.
Le ou les schémas unilinaires et de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.
Le prochain contrôle périodique est à effectuer, sans modification importante de l'installation électrique, avant le 14/02/2044.

Signature de l'agent

Signature du responsable de l'exécution des travaux

PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 28/2019/53495/01:1

RÉF. 28/2019/53495/01:2

REMARQUES

- L'appareillage électrique fixe ou à poste fixe suivant n'est pas présent - machine à laver/ sèche-linge
- Lumières ne sont pas présents

DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE DE L'INSTALLATION :

Il a pour obligation de conserver le procès-verbal de conformité ou de contrôle dans le dossier de l'installation électrique, de renseigner dans le dossier les modifications apportées à l'installation électrique, en cas d'accident aux personnes dû à l'électricité de prévenir le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, d'assurer ou de faire assurer l'entretien de l'installation et de veiller à ce que l'installation reste conforme en tout temps, de refaire contrôler l'installation en cas d'infraction(s) avant un délai d'un an et par le même organisme en cas de visite de contrôle, et si suite à un contrôle pour la vente d'une installation électrique datant d'avant le 1er octobre 1981, avant un délai de 18 mois à dater du jour de l'acte de vente par l'organisme de son choix. Dans le cas où, lors de la seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques. Le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, est informé, par l'organisme agréé qui a effectué la visite de contrôle, de l'existence d'infractions au cas où il n'est pas donné suite à la remise en ordre de l'installation.

En résumé, quelles sont les mesures à prendre si l'installation électrique est conforme ?

1

Lisez
attentivement ce
procès-verbal

2

Lors d'extensions,
de modifications
importantes de
l'installation, faites
la recontrôler

3

Au terme de la
validité du rapport,
faites recontrôler
votre installation

4

Certinergie est à
votre service
0800 82 171

PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION



EXEMPLAIRE ORIGINAL

CET RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 28/2019/53495/01:1

RÉF. 28/2019/53495/01:2

ANNEXES

Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation

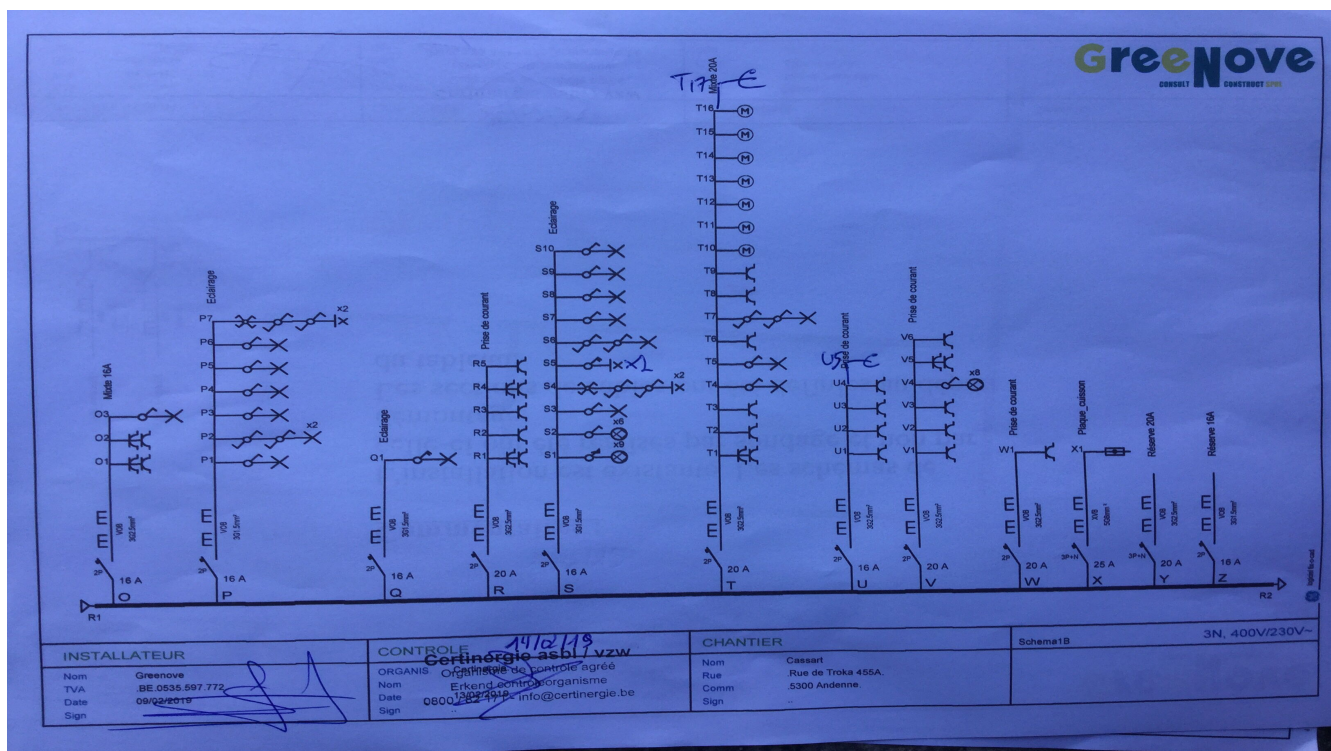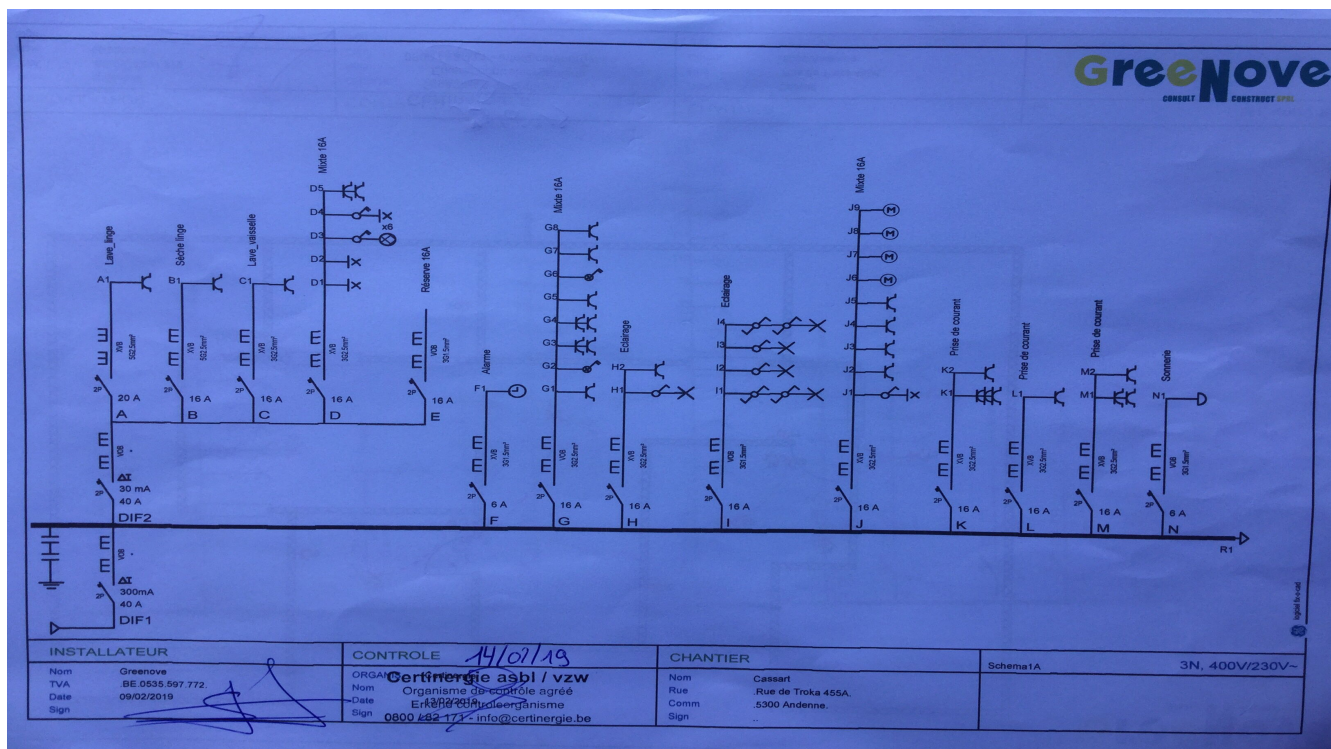

PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 28/2019/53495/01:1

RÉF. 28/2019/53495/01:2

ANNEXES

Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation

Greenove

Greenove
CONSULT - CONSTRUCT - INFO

Commentaires :

L'installation est existante. Les schémas de celle-ci ont été réalisés par sondage et non par démontage.
Les sections de câbles ont été définies au départ du tableau.

INSTALLATEUR

Nom: Greenove
TVA: BE 0535 597 772
Date: 09/02/2019
Sign: [Signature]

CONTROLE

19/02/19
Certinergie asbl / vzw
ORGANIS. Organisme de contrôle agréé
Nom: [Signature]
Date: 09/02/2019
Sign: info@certinergie.be

CHANTIER

Nom: Cassart
Rue: Rue de Troka 455A
Comm: 5300 Andenne
Sign: [Signature]

Schema1C 3N, 400V/230V~

Plan(s) de position de l'installation

Greenove

Greenove
CONSULT - CONSTRUCT - INFO

Plan(s) de position de l'installation

INSTALLATEUR

Nom: Greenove
TVA: BE 0535 597 772
Date: 09/02/2019
Sign: [Signature]

CONTROLE

19/02/19
Certinergie asbl / vzw
ORGANIS. Organisme de contrôle agréé
Nom: [Signature]
Date: 09/02/2019
Sign: info@certinergie.be

CHANTIER

Nom: Cassart
Rue: Rue de Troka 455A
Comm: 5300 Andenne
Sign: [Signature]

Caves 3N, 400V/230V~

PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 28/2019/53495/01:1

RÉF. 28/2019/53495/01:2

ANNEXES

Plan(s) de position de l'installation

